

Reporte de Avance Viernes 1 de Agosto 21:00

Plan de Rescate Trabajadores Teniente 7

Avance a la fecha

- Se realizó inspección y verificación de condiciones en el sector para acceder al sector.
- Preparación de frente de trabajo, traslado de materiales, suministros y equipos.
- El avance total es de 4 metros lineales frente norte (sobre 20 metros estimados).
- Se comenzó a trabajar por una segunda frente para acceder al lugar (frente sur).
- Estado sísmico estable, con tendencia a la baja (actualmente 70 sismos/h).



4 metros

Avance
Lineal



Estable

Estado
Sísmico



100
personas

Cuadrilla de
rescate
32 x turno



Toneladas
removidas

300
5.000
toneladas
aprox. a
remover


Próximos Hitos

- Se continuará trabajando durante turno de noche.
- Preparación de construcción de tren de marcos (fortificación).

Personas

- Se estable contacto con familiares directos de los 5 trabajadores atrapados.
- Se realiza contención psicológica al equipo de brigada de rescate y apoyo particular al equipo más afectado.

Descripción de las actividades

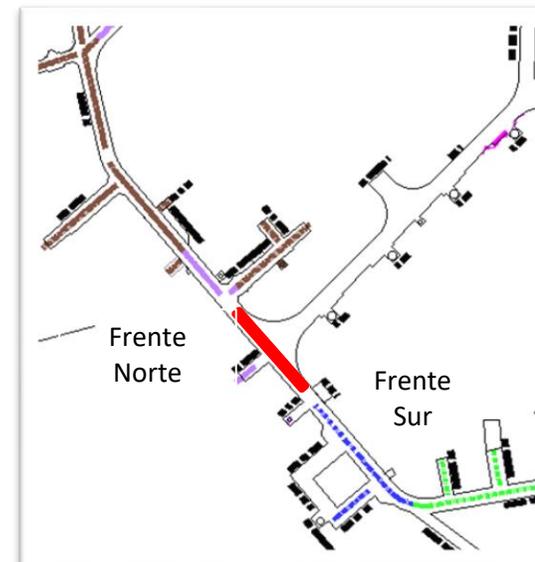

- 3 equipos LHD (cargador frontal) a control remoto
- Se cuenta con 10 equipos menores.
